


工事内容について


工事中は交通への影響を最小限に止めるようにしますが、付近を通行の皆様にはご迷惑をお掛けします。工事へのご理解・ご協力をお願い致します。

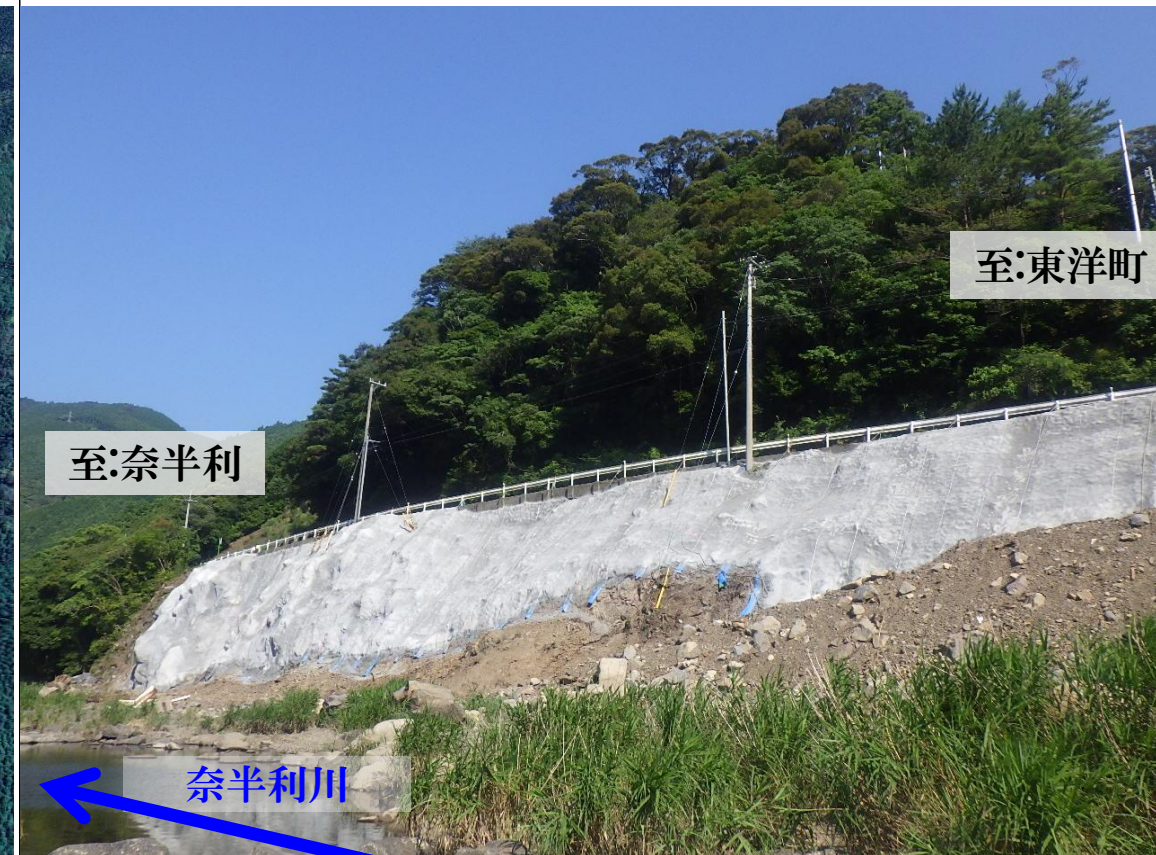

施工場所を川側から(6月末)

北川道路改築工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 監理技術者 田中 秀幸 (携帯090-6286-5602)

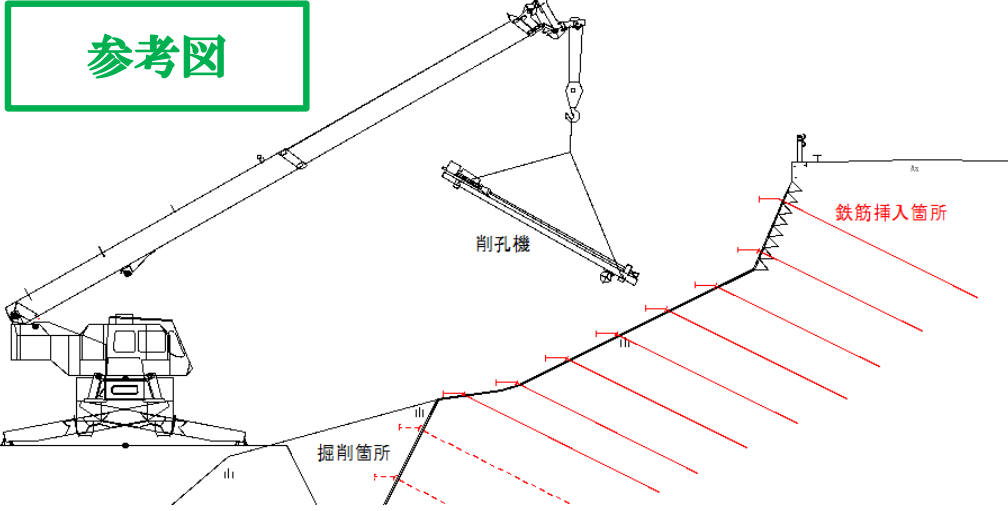作業内容	○ 7 月	○ 6 月	
○6月 法面上部からモルタル吹付を行いました。 ○7月 鉄筋挿入工を施工していきます。 河川側より、クレーンにて削孔機を吊り上げ、削孔を行います。河川を濁らさないよう注意して施工します。 安全第一で工事を進めていきます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。	参考図  モルタル吹付・鉄筋挿入工は、現道の補強を行うものです。7月より鉄筋挿入工を行っていきます。 下流側から河川内を移動し、参考図のようなラフテレーンクレーン25tにて削孔機を吊上げ・削孔し鉄筋を挿入していきます。 挿入後は、グラウト材を注入し鉄筋を定着します。	左 吹付状況  吹付完了  掘削ラインより上部のモルタル吹付を完了しました。 掘削ラインより下部は、河川増水による影響を避けるため、鉄筋挿入工が完了後、順次掘削を行う計画です。	2025年 6月 【第3号】 (発注者) 高知県安芸 土木事務所 道路建設課 第三担当 【工事ニュース作成者】 (受注者) 株式会社 勝賀瀬土建
